

# C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

## RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

### COMPTE RENDU N°17 DE LA RÉUNION DU 06/04/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:spaggiari-freres@spaggiari-freres.com">spaggiari-freres@spaggiari-freres.com</a> ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94				
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:mg-constructions26@orange.fr">mg-constructions26@orange.fr</a>	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54				
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:contact@ossaturbois.com">contact@ossaturbois.com</a> ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63				
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:menuiseriealexandre26@gmail.com">menuiseriealexandre26@gmail.com</a>	06 17 15 44 42				
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL <a href="mailto:victorpalmeira26@gmail.com">victorpalmeira26@gmail.com</a>	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:bernard.zambeaux@free.fr">bernard.zambeaux@free.fr</a>	06 15 26 96 56				
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS <a href="mailto:betgrd26@laposte.net">betgrd26@laposte.net</a>	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE <a href="mailto:epsi.eurl@gmail.com">epsi.eurl@gmail.com</a>	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 <a href="mailto:mairiebeauvoisin@gmail.com">mairiebeauvoisin@gmail.com</a>	04 75 28 02 71				

## Avancement des travaux

- Poutre 5x20 pour rattrapage de niveau attique troisième travée Halle posée,
- Etanchéité toiture local Services, réalisée,
- Isolation des murs local Services, en cours de pose,
- Structure pergola, posée,
- Cales de rattrapage pour châssis alu 5 et +6, posées,
- Points d'ancrage de tirants de la charpente Halle, modifiés,
- Verrou sur fenêtres alu , posés
- Encastrement des gaines électriques Toilettes accessibles, réalisé,
- Projecteur Halle donnant sur extérieur, déposé,
- Rideaux bar du local services, posés,
- Châssis alu 5 et 6, posés,

## Problèmes particuliers

### Au maître d'ouvrage

En conséquences de l'épidémie, des mesures de confinement et des difficultés rencontrés par les entreprises dans la réalisation des travaux, les délais d'exécutions contractuels ne pourront être tenus

### A toutes les entreprises

**Compte tenu des problèmes induits par le confinement relatif à l'épidémie du covid 19, il est demandé à toutes les entreprises pouvant intervenir sur le chantier de prévenir, au préalable, l'architecte afin de programmer la date et horaire de leurs interventions.**

### Aux entreprises

#### Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI


- Réaliser tranchée pour alim électrique du bâtiment Toilettes.
- Mettre terre arable pour plantation vigne vierge (Façade Sud local Services),
- Ressortir Delta MS du drain nord, enfoui dans remblais,
- Remblayer autour bâtiment Rangement,
- Rapprocher le regard sous robinet de puisage à 8 cm du béton brut longrine,
- Remonter branchages pins contre mur arrière toilettes et recouvrir de terre
- Voir avec entreprise OSSATURBOIS pour changement d'une ou deux plaques PST sur rampant ouest halle et pour repose d'une partie de la gouttière pendante,
- T.S. : Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre,
- Déplacer regard électrique et rentrer gaine alim électrique en VS et la sortir à + 30 du dallage brut,

#### Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- Percer longrines béton Local Rangements pour ventilation V.S. 2 x Ø100,
- Réaliser enduits intérieurs Rangements et Toilettes accessibles : blanc cassé frotassé fin, (après réalisation des plafonds placo,
- Sceller HA 10 en massif sous pied de poteau Halle afin de le solidariser avec le futur dallage,
- Couleur enduits extérieurs mur clôture: beige gratté,
- Réaliser bandes d'enduit ext. pour Rangements entre -0.10 et +0.20 du niveau de la terre, beige gratté dito mur clôture,

## Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- Poser bavette alu sur châssis Rangement,
- Accord pour trop plein par débordement,
- Accord pour remplissage chéneau avec gravier de gros diamètre,
- Poser crépine sur évacuation EP,
- Trouver raccord pour descente E.P., PCV Ø 160 avant collage,
- Poser fers lisses Ø 10 tous les 60 ou 70cm d'entre axe perpendiculairement aux poutres bois pergola

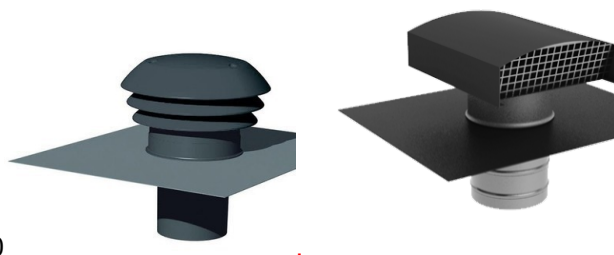

- Réaliser sortie de toit pour hotte Office Ø 160

## Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO

- Intervenir quand approvisionné et autorisé compte tenu de l'épidémie Covid-19,
- Profils galva des doublages, 48 mm,
- Ok pour détail retour en tableau avec 20 mm de placage sur ossature bois.

## Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

- Plans bar à poser au plus tôt, pour pose des volets roulants,
- Ok pour pente de 1% sur plan bar handicapés (sud) avec petit rejingot et rainure goutte d'eau,
- Pose des menuiseries extérieures du local Services, local Rangements et Toilettes accessibles au plus tôt,
- Fourniture des menuiseries intérieures Voir date avec entreprise Giacomino.
- Prévoir cadres dormants avec feuillures de 75 mm pour encastrement des cloisons (pas de couvre joint),
- Accord pour cadres placards à recouvrements à poser après réalisation des cloisons,
- Accord pour portes placards MDF couleur naturelle (miel)
- Ok pour 1 seul oculus sur ouvrant de 90 de la porte d'entrée,

## Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

- Réaliser encastrement des gaines électriques local Rangements,
- Fournir et poser 3 vannes dans regard arrivé d'eau,

## Carrelages Faïences/PALMEIRA Victor

- Venir à la prochaine réunion de chantier avec échantillons de carrelages et faïences pour choix avec maître d'ouvrage.

**PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER selon corona  
ENTREPRISES CONVOQUÉES sans objet**
