

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°16 DE LA RÉUNION DU 16/03/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94			X	X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Julien MARIE			X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël DEBOULE			X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Laurent RIOU			X
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42	Alexandre PASCAL			X
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13	Vivien GIACOMINO			X
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Laurent RIOU			X
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Laurent RIOU			X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56			X	X
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT, Jean-Jacques C, Bruno B.			

Avancement des travaux

- Couverture local service terminée, étanchéité en cours,
- Tableau de la porte extérieure Rangements, repris aux cotes finies hors tout de 103 x 212h,
- Arase armée du mur de clôture, réalisé,
- Appuis de fenêtres, posés,
- Pose des fenêtres alu local services et local Rangement, en cours de finition.

Problèmes particuliers

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

- Réaliser tranchée pour alim électrique du bâtiment Toilettes.
- Mettre terre arable pour plantation vigne vierge (Façade Sud local Services),
- Ressortir Delta MS du drain nord, enfoui dans remblais,
- Remblayer autour bâtiment Rangement,
- Rapprocher le regard sous robinet de puisage à 8 cm du béton brut longrine,
- Remonter branchages pins contre mur arrière toilettes et recouvrir de terre
- Voir avec entreprise OSSATURBOIS pour changement d'une ou deux plaques PST sur rampant ouest halle et pour repose d'une partie de la gouttière pendante,
- T.S. : Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre,
- Déplacer regard électrique et rentrer gaine alim électrique en VS et la sortir à + 30 du dallage brut,


Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- Vérifier efficacité du drain nord. Percer dalle pour évacuation eau stagnant sur dalle, puis attendre fortes pluies pour constat,
- Percer longrines béton Local Rangements pour ventilation V.S. 2 x Ø100,
- Réaliser enduits intérieurs Rangements et Toilettes accessibles : blanc cassé frotassé fin, (après réalisation des plafonds placo,
- Sceller HA 10 en massif sous pied de poteau Halle afin de le solidariser avec le futur dallage,
- Couleur enduits extérieurs mur clôture: beige gratté,
- Réaliser bandes d'enduit ext. pour Rangements entre -0.10 et +0.20 du niveau de la terre, beige gratté dito mur clôture,
- T.S. : Chiffrer reprise de dallage/caniveau en béton lissé à réaliser sous façade nord Halle 11m2. Compris armatures treillis soudé + bèches de rives et pente côté Est,
- T.S. : Chiffrer réalisation de 5 regards pour ventilations des 4 volumes du V.S. local Services + percements longrine.

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- Poser poutre 5x20 pour rattrapage de niveau attique troisième travée Halle,
- Poser isolant des murs,
- Poser cales de rattrapage pour châssis alu 5 (Déplacer 2 points d'ancrage de tirants de la charpente Halle),
- Accord pour trop plein par débordement,
- Accord pour remplissage chéneau avec gravier de gros diamètre,
- Poser crépine sur évacuation EP,
- Trouver raccord pour descente E.P., PCV Ø 160 avant collage,

- Réaliser sortie de toit pour hotte Office Ø 160,
- du genre..., ou similaire

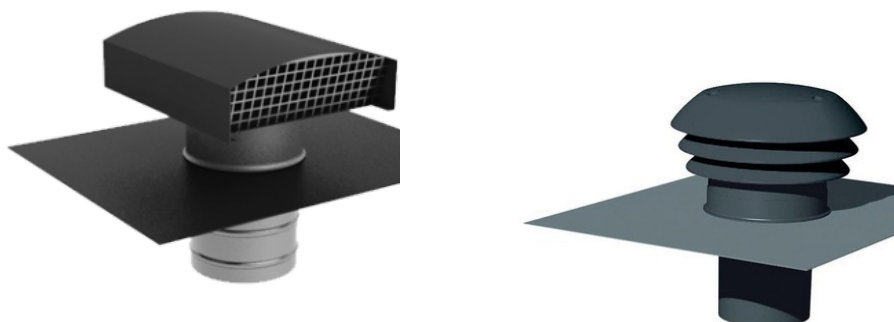

Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO

- Intervenir quand approvisionné et autorisé compte tenu de l'épidémie Covid-19,
- Profils galva des doublages, 48 mm,
- Ok pour détail retour en tableau avec 20 mm de placage sur ossature bois.

Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

- Plans bar à poser au plus tôt, pour pose des volets roulants,
- Ok pour pente de 1% sur plan bar handicapés (sud) avec petit rejingot et rainure goutte d'eau,
- Pose des menuiseries extérieures du local Services, local Rangements et Toilettes accessibles au plus tôt,
- *Accord pour pose de cadres dormants bois pour permettre au plaquiste de commencer à travailler sans attendre la pose des portes, (Voir si cela sera nécessaire compte tenu du décalage Corona)*
- Fourniture des menuiseries intérieures Voir date avec entreprise Giacomino.
- Prévoir cadres dormants avec feuillures de 75 mm pour encastrement des cloisons (pas de couvre joint),
- Accord pour cadres placards à recouvrements à poser après réalisation des cloisons,
- Accord pour portes placards MDF couleur naturelle (miel)
- Ok pour 1 seul oculus sur ouvrant de 90 de la porte d'entrée,

Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

- Poser verrou sur fenêtres alu du local services et du local Rangement
- Encastrement des gaines électriques local Rangements et Toilettes accessibles
- Fournir et poser 3 vannes dans regard arrivée d'eau,
- Ok pour suppression prises électriques intérieures en WC accessibles,
- Déposer projecteur Halle donnant sur extérieur (avant pose châssis alu) + mise en dépôt pour réutilisation,
- (A reposer sous Auvent Orchestre)
- Pose des rideaux bar du local, se mettre en rapport avec entreprise Pascal Alexandre pour date de pose des plans Bar.

Carrelages Faïences/PALMEIRA Victor

- Venir à la prochaine réunion de chantier avec échantillons de carrelages et faïences pour choix avec maître d'ouvrage.

**PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER selon corona
ENTREPRISES CONVOQUÉES CF. TABLEAU CI-DESSUS**
